Tweede programmarapportage Uitvoeringsprogramma Baggeren 2026

1 mei t/m 31 augustus 2026



Auteur
P. Groen

Registratienummer
26.1002878

Datum
15 augustus 2026

Status
Definitief

Afdeling
Watersystemen

Foto's afgelopen periode

Op de voorpagina staat een foto van de binnenkant van een beekriool in Beverwijk. In Beverwijk beheren we 20 beekriolen van 120 tot 840 meter lang. De beekriolen maken onderdeel uit van het watersysteem en worden schoongemaakt van bagger en ander materiaal dat zich in de riolen bevindt. Na het schonen wordt de constructie van de duikers geïnspecteerd middels een camera en indien nodig worden constructieve maatregelen genomen.



Hiernaast staat een foto van het baggeren en herstel van rietoevers in het noordoosten van de Wieringermeer. Het betreft waterlopen met snelle toestroom van bagger en veel ijzerhoudende kwel. Te herkennen aan de roestbruine kleur van het water en de bagger zodra deze in aanraking komt met zuurstof.

Hieronder staan foto’s van het baggeren in de Schagerkogge en in het stedelijk gebied van Enkhuizen





Samenvatting

Van de 5724 km watergangen die HHNK middels baggeren op diepte houdt, wordt jaarlijks circa 700 km gepeild en vervolgens getoetst aan de normafmetingen. Medio 2025 is bepaald dat hiervan in 2026, 318 km zou worden gebaggerd. De prognose is dat er 369 km waterloop in 2026 zal worden gebaggerd. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat er in 2026 aanzienlijk meer wordt gebaggerd in het landelijk gebied, enkele landelijke werken zijn vanuit 2025 doorgeschoven en worden in 2026 afgerond en daarnaast worden enkele landelijke baggerwerken in 2026 al opgeleverd in plaats van in 2027.

Om schommelingen in kosten op te vangen is een baggervoorziening ingericht waaraan in 2026 € 4,6 miljoen wordt toegevoegd. De prognose is dat in 2026 € 7,0 miljoen aan de voorziening wordt onttrokken.

Programma Baggeren

Algemeen
Ons watersysteem voldoet (indien mogelijk) aan de leggerafmetingen en, indien van toepassing, aan het brede kijk- en/of vaarwegprofiel. De waterbodems vormen geen belemmering voor het behalen van de waterkwaliteitsdoelen. Het Uitvoeringsprogramma Baggeren draagt bij aan het behalen van deze doelen en daarmee aan de effecten Voldoende water, Gezond water en Veilige vaarwegen. Vanwege het zwaartepunt wordt gerapporteerd bij het effect Voldoende water.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is verantwoordelijk voor het op de juiste diepte houden van 5724 km watergangen.

Het kader voor het op de juiste diepte houden van de waterbodems is het in februari 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde Beleidsplan Waterbodems (11.0041019). De baggerplicht van HHNK en de vereiste waterloopafmetingen voor de aan- en afvoer van water volgen uit de Legger Wateren.

Het op orde houden van de watergangen vindt plaats door alle watergangen cyclisch te meten, te toetsen aan de legger en andere normafmetingen en indien nodig te baggeren. Daarnaast worden er ingrepen in de waterbodem gedaan als maatregel vanuit de Kaderrichtlijn Water ter verbetering van de waterkwaliteit. De kosten per kilometer baggerwerk kunnen -afhankelijk van de locatie (landelijk, stedelijk of boezem), periode van uitvoering en de kwaliteit van de baggerspecie- sterk uiteenlopen.

Om schommelingen in kosten op te vangen is de voorziening baggeren ingericht waaraan in 2026 € 4,6 miljoen wordt toegevoegd volgens de vastgestelde meerjarenraming Baggeren (25.1194175).

Resultaten en financiën 2026

Van de 5724 km watergangen die HHNK middels baggeren op diepte houdt, wordt jaarlijks circa 700 km gepeild en vervolgens getoetst aan de normafmetingen. Medio 2025 is bepaald dat hiervan in 2026, 318 km zou worden gebaggerd. De T1 prognose was dat er 361 km waterloop in 2026 zal worden gebaggerd deze is voor de T2 bijgesteld naar 369 km. Per saldo is het verschil minimaal.


Op het niveau van baggerwerken zijn er wel verschuivingen, wat te zien is in de afname van de te baggeren kuubs. De prognose van het baggeren van kanalen in de Wieringermeer is verlaagd (weinig km, veel kuubs) en prognoses van baggerwerken in het landelijk gebied (veel km, relatief weinig kuubs) zijn verhoogd. Onderstaand is de prognose weergegeven qua uit te voeren werken in km waterloop en m^3 bagger (tabel 1) en de bijbehorende financiën (grafiek 1 en tabel 2).

In de aangehechte bijlage is op een kaart weergegeven waar in 2026 is gebaggerd, waar baggerwerken in uitvoering zijn en voor welke gebieden baggerwerken zijn of worden voorbereid voor uitvoering in 2026 of later.

	Begroting	Prognose T1	Prognose T2
km waterloop te baggeren	318	361	369
m^3 te baggeren x 1.000	506	593	566

Tabel 1: Resultaat 2026

Financiën

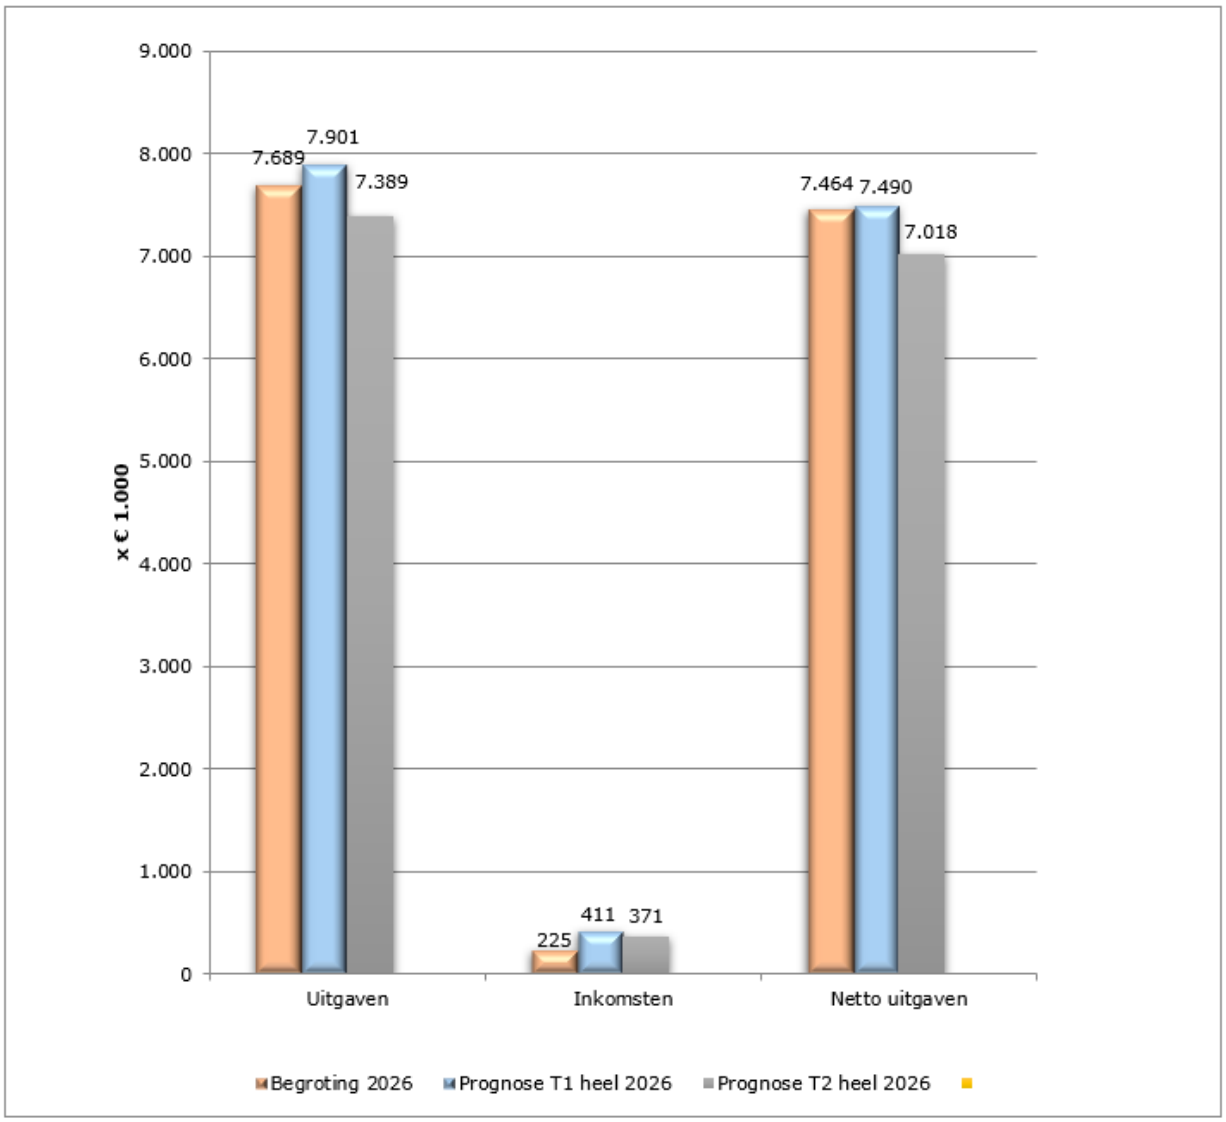

Grafiek 1: Het resultaat 2026 ten opzichte van de geplande onttrekking voor de begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

Uitgaven (bruto)	De prognose van de (bruto) uitgaven is € 0,51 miljoen (6,5%) lager dan de T1 prognose en € 0,30 miljoen (3,9%) lager dan begroot. De voornaamste redenen van de verschillen met de T1 prognose zijn: • Gunstige aanbestedingen (-€ 0,38 miljoen) van: - combinatiewerk herstel rietoevers en baggeren kwelsloten Wieringermeer; - baggerwerk vaarten Wieringermeer in combinatie met het verkrijgen van subsidie voor het duurzaam uitvoeren van het project. • Werken die achterlopen op de planning door onvoorziene omstandigheden (-€ 0,24 miljoen) zoals plotselinge afwezigheid van collega of medewerkers van aannemers en omdat er meer afstemming nodig is met de omgeving voor het vinden van geschikte baggerafzet of optimale samenwerking. Het risico dat bagger afgevoerd moet worden omdat baggerafzet nabij de te baggeren waterloop niet mogelijk is neemt toe. • Een aantal werken lopen voor op de planning waardoor een deel van het landelijke baggerwerk 2027 al in 2026 wordt uitgevoerd (+€ 0,11 miljoen)
Inkomsten	De verwachte inkomsten zijn € 0,04 miljoen (9,7%) lager dan de T1 prognose en € 0,15 miljoen (64,8%) hoger dan begroot. De voornaamste reden van het verschil met de T1 prognose is dat er minder bagger wordt aangeboden door derden bij onze baggerdepots.
Uitgaven (netto)	De prognose voor de netto-uitgaven is door bovenstaande wijzigingen € 0,47 miljoen (6,3%) lager dan de T1 prognose en is in totaal € 0,45 miljoen (6,0%) lager dan begroot.

Tabel 2: Toelichting financiën

Bijlage Statusoverzicht baggerwerken

