



c) Uitvoeringskrediet vervanging waterbouwasfalt Helderse Zeewering

Kern van de zaak

Uitvoeringskrediet van € 5,0 miljoen voor het vervangen van waterbouwasfalt op de Helderse Zeewering

Op basis van de resultaten van de eerste landelijke beoordelingsronde (LBO1) is het versterken van de Helderse Zeewering geprogrammeerd op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2023 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gestart met de verkenningsfase van dit project, dit jaar wordt gestart met de projectbesluitprocedure ten behoeve van deze versterking die plaatsvindt tussen Fort Kijkduin en Hotel Lands End. Realisatie van de dijkversterking is voorzien vanaf 2027 en voorziet in een versterking aan de onderkant van de zeezijde van de dijk.

Ter hoogte van Kaaphoofd bereikt aan de bovenzijde van de dijk (vak 3 circa 1200 strekkende meter) het daar aanwezige waterbouwasfalt in 2035 einde levensduur. De vervanging hiervan voorziet in het afschrapen van een dun laagje van het waterbouwasfalt en het terugbrengen van een dikkere laag waterbouwasfalt. Een illustratie van de locatie is aan dit voorstel gevoegd.

Gezien de te verwachten synergievoordelen op het gebied van voorbereiding, aanbesteding en realisatie wordt voorgesteld deze vervangingsopgave als meekoppelskans op te nemen in de HWBP versterking Helderse Zeewering. De vervanging van het waterbouwasfalt valt onder regulier beheer en onderhoud en komt niet in aanmerking voor subsidiering door het HWBP. De gevraagde € 5 miljoen is dus in zijn geheel bedoeld voor het als meekoppelskans meenemen van een onderhoudsopgave bij het HWBP project Helderse Zeewering.

Strategie en beleid

Het effect Waterveiligheid neemt een prominente plaats in binnen ons Waterplan 2022-2027 (21.0831544). Deze vervangingsopgave is onderdeel van onze reguliere taak van het op peil houden van het waterveiligheidsniveau van onze primaire waterkeringen.

Met het versterken van de Helderse Zeewering werkt het hoogheemraadschap aan de doelstellingen van de Deltavisie. Het combineren van opgaves door het meekoppelen van de vervanging van het waterbouwasfalt met de versterking van de Helderse Zeewering draagt bij aan de ambitie van HHNK om maatschappelijk verantwoord en doelmatig te werk te gaan.

Eerdere bestuursbesluiten

03/12/2024 (D&H) Voorkeursalternatief dijkversterking Helderse Zeewering (24.1049729)

Kansen en risico's

Kansen:

Instemming met dit voorstel maakt het koppelen van een nabije onderhoudsopgave aan de dijkversterking mogelijk. Deze onderhoudsopgave kan daardoor meer doelmatig worden uitgevoerd en voorkomt dat relatief kort na realisatie van de dijkversterking een deel van de dijk nogmaals door HHNK wordt aangepakt en omwonenden wederom hinder ondervinden.



Datum

30 maart 2026

Risico's indien u instemt met dit voorstel:

Het aangevraagde uitvoeringskrediet is bepaald op basis van ramingen. Het uiteindelijke aanbestedingsresultaat kan, zeker gezien de huidige economische onzekerheden, hoger uitvallen waarna een aanvullend kredietvoorstel aan u wordt voorgelegd.

Risico's indien u niet instemt met dit voorstel:

- Kan de onderhoudsopgave niet gekoppeld worden aan de dijkversterking en kan bij het toekomstige onderhoud het beeld in de omgeving ontstaan dat HHNK in relatief korte tijd twee keer aan de dijk aan het werken is. Bovendien ondervinden omwonenden dan in korte tijd twee keer hinder van werkzaamheden aan dezelfde dijk.
- Vallen de kosten voor deze onderhoudsopgave waarschijnlijk hoger uit dan wanneer deze nu mee gekoppeld wordt aan het HWBP project Helderse Zeewering waardoor HHNK minder doelmatig werkt.

Financiële consequenties

Het uitvoeringskrediet voor de vervanging van het waterbouwasfalt is € 5,0 miljoen. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering komen overeen met de kapitaallasten van het meerjarenperspectief (MJP) 2027-2031. Omdat het betreffende asfalt einde levensduur had bereikt stond er geen jaarlijks onderhoudsbudget geprogrammeerd, er valt dus geen onderhoudsbudget vrij.

Via de concernrapportages wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de investering.

Categorie

De vervanging van het waterbouwasfalt aan Helderse Zeewering valt onder de categorie 'taakuitvoering'. In dit geval gaat het om het beheer en voorkomen van schade aan de waterstaatswerken.

Personele gevolgen

Dit voorstel heeft geen personele consequenties, omdat het meegekoppeld wordt met het HWBP project Helderse Zeewering. Het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van de uitvoering wordt opgepakt door het projectteam Helderse Zeewering. De benodigde capaciteit is opgenomen binnen deze aanvraag en kan binnen de bestaande personele bezetting worden ingevuld.

Participatieaspecten

De omgeving is actief geïnformeerd over en betrokken bij de verkenning- en planuitwerkingsfase van het project versterking van de Helderse Zeewering. De voorgenomen versterking krijgt positieve reacties.

Publieksvoorzieningen

Geen.

Communicatieaspecten

Geen.


Overige consequenties en vervolg

Na de zomer start de ter inzage legging van het ontwerp projectbesluit versterking Helderse Zeewering. Dit onder voorbehoud van positieve besluitvorming in juni door het dagelijks bestuur over het ontwerp projectbesluit. Aanbesteding van het werk is voorzien in 2027. Realisatie van het totale HWBP project Helderse Zeewering is voorzien voor de periode 2027-2029, de onderhoudsopgave van het asfalt niet eerder dan 2028. De uitvoering van deze

Datum
30 maart 2026

onderhoudswerkzaamheden is al eerder opgevoerd in P&C producten en steeds uitgesteld om aan te kunnen haken bij het HWBP project.

Bijlagen

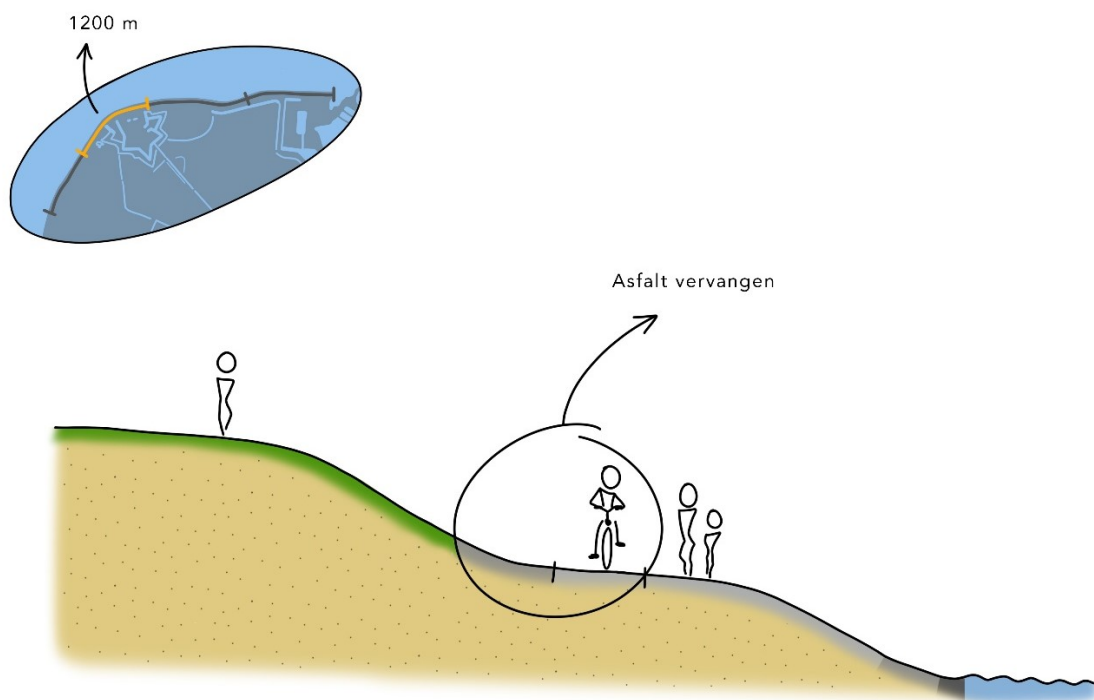

Visualisatie van aard en locatie onderhoudsopgave
